

SCHULE

ORT, 18.01.2016

Gruppe
Straße
PLZ ORT

TheoPrax-Zentrum
Fraunhofer ICT
Joseph-von-Fraunhofer-Str. 7

76327 Pfinztal

TheoPrax - Projektangebot

Projekt-Nummer: P951

Projekt-Thema: Themenwagen, universeller Transportwagen

Sehr geehrte Frau T.,

hiermit senden wir Ihnen unser Angebot für einen Themenwagen zu.

Projekt-Gruppe: Klasse 8

Projekt-Thema: Themenwagen

Zieldefinition: Ein Themenwagen soll dem Betreuungspersonal die Arbeit mit den Patienten erleichtern.

Geplante Projektergebnisse: Ein praktischer Transportwagen, der zur Aufbewahrung von Therapiematerial eingesetzt werden kann, bestehend aus:

- Holzwagen mit 4 variabel einsetzbaren Trennwänden
- Zwei Einlegeböden
- 4 Rollen (davon 2 Feststellrollen)
- Zwei Griffstangen
- Rückwand mit Lochbohrungen
- Holz: Multiplexplatten aus Birke
- Das Holz wird mit Wachs und Öl biologisch oberflächenbehandelt.

Projektstrukturplan: siehe Anlage 1

Nach Erteilung des Auftrags wird mit der Herstellung des Themenwagens begonnen.

Planungsphase: Strategietraining, Methodentraining, Themenfindung, Recherche, Angebotserstellung

Herstellungsphase: Bauplan erstellen, Material vorbereiten, Materialoberfläche behandeln, Zusammenbau

Abschlussphase: Dokumentation, Präsentationsvorbereitung, Abschlusspräsentation

Ort der Bearbeitung:

- SCHULE
- Schreinerei NAME, ORT

Art der Bearbeitung:

Wir wollen den Themenwagen herstellen durch ...

- Bauplanerstellung am PC (Schreinerei)
- Sägen und bohren (Schreinerei)
- Oberflächenbehandlung, wie ölen und wachsen (Schreinerei)
- Zusammenbau des Wagens (Schreinerei)

Projektablaufplan: siehe Anlage 2

Kostenplan:	<u>1) Sachkosten</u>	Materialaufwand	185,00 €
		Zeitaufwand (5 Std)	300,00 €
		2 Griffe	24,00 €
		4 Rollen	40,00 €
		Zwischensumme SK:	549,00 €
	<u>2) Reisekosten</u>	PKW (100 km)	10,00 €
		Zwischensumme RK:	10,00 €
	<u>3) Gesamtkosten</u>	<u>Gesamtsumme:</u>	<u>559,00 €</u>

Zahlungsbedingungen: 4 Wochen nach Einreichung der Rechnung
Erweitertes Angebot: Eventuelle weitere Kosten werden mit dem Auftraggeber besprochen und müssen von diesem schriftlich bewilligt sein.

Gültigkeit des Angebotes: 3. März 2016

Projektteammitglieder:

1. C.K.
2. J.R.
3. L.M.
4. S.M.
5. F.H.
6. T.W.

Projekteamsprecher:

C.K. [Email](#)
J.R. [Email](#)

Projektbetreuer:

LEHRKRAFT
SCHULE
Straße
PLZ ORT

Betreuer (Auftraggeber):

NAME
Haus der Betreuung und Pflege
Straße
PLZ ORT

Wir freuen uns, wenn Sie dieses Angebot annehmen und uns den Auftrag für das Projekt erteilen.

Mit freundlichen Grüßen


ORT, 18. Januar 2016

C.K., J.R.

Teamsprecher

Anlagen (2)

Anlage 1: Strukturplan

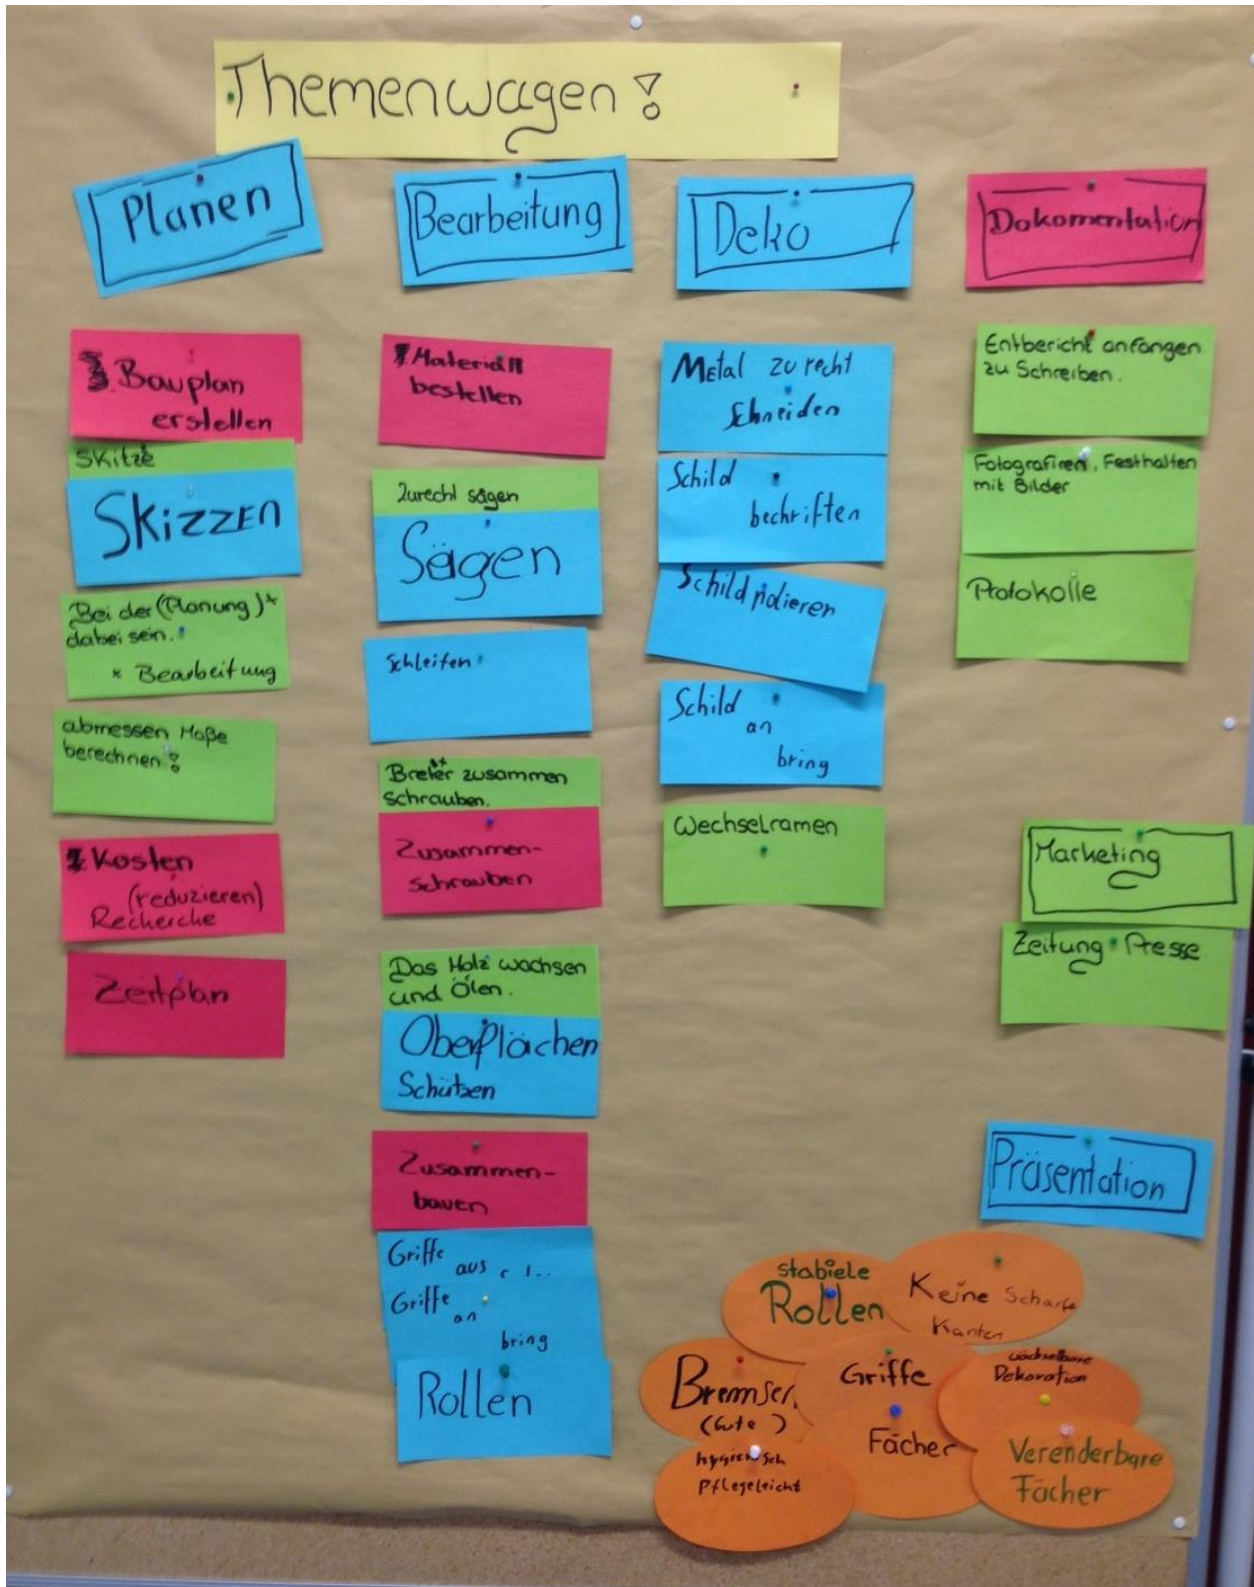

Fach:				November					Deze	
		02. 11.	09. 11.	16. 11.	23. 11.	30. 11.	07. 12.	14. 12.		
Arbeitstage:	Tage gesamt/Mon	25					1			
	Tage gesamt/Mon	20					1			
	Tage	5	5	5	5	5	5			
	Auto_KW	45	46	47	48	49	50	51		
		KW 45	KW 46	KW 47	KW 48	KW 49	KW 50	KW 51		
Phase/Tätigkeit		Wer? (Gruppe/Person)								
Einführung		alle								
	Strategietraining									
	Methodentraining									
	Strukturplan									
Themenfindung		alle								
	Firmenakquise									
	Projektthema									
	KickOff									
	Recherche									
Angebotserstellung										
	Kostenrechnung	Gruppe 1								
	Erstellung	Gruppe 2								
Bauplan										
	Erstellung Skizze	Abdellah, Carina, Cornelia								
	Materialbestellung	Timo, Josephine, Yasmin								
Bearbeitung		alle								
	Material bearbeiten									
	Oberfläche bearbeiten									
Fertigstellung		alle								
	Zusammenbauen									
Dokumentation		Sabrina, Timo, alle								
	Erstellung									
	Abgabe									
Präsentation		alle								
	Vorbereitung									
	Vortrag									

mber		Januar					Februar					März					Ap	
8	21.12.	28.12.	04.01.	11.01.	18.01.	25.01.	01.02.	08.02.	15.02.	22.02.	29.02.	07.03.	14.03.	21.03.	28.03.	04.04.	11.04.	
2	19					25					18					2		
2	15					25					14					2		
4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	5	5		
52	53	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
KW 52	KW 53	KW 01	KW 02	KW 03	KW 04	KW 05	KW 06	KW 07	KW 08	KW 09	KW 10	KW 11	KW 12	KW 13	KW 14	KW 15		

[illegible]

iri		Mai						Juni		
18. 04.	25. 04.	02. 05.	09. 05.	16. 05.	23. 05.	30. 05.	06. 06.	13. 06.	20. 06.	
4				22				20		
4				14				20		
5	5	4	5	4	4	5	5	5		
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
KW 16	KW 17	KW 18	KW 19	KW 20	KW 21	KW 22	KW 23	KW 24	KW 25	

[illegible]
